

There are no translations available.



El aprendizaje por proyectos es un método didáctico creado en 1918 con la intención de mejorar los procesos de aprendizaje enriqueciéndolos a través del trabajo autónomo del alumno. las TIC, tal como vamos a comprobar en este monográfico pueden aportar un valor añadido a esta metodología que, a pesar de tener casi un siglo de antigüedad sigue aun vigente.

Introducción

Definición

El método de aprendizaje por proyectos se fundamenta en la teoría constructivista del aprendizaje. Consiste en partir de los intereses de los alumnos para que planeen, desarrollen y evalúen investigaciones sobre temas reales pertenecientes a su contexto social, escolar, cultural, económico, natural, etc.; definir un problema y elaborar un plan para resolverlo.



Las TIC y el aprendizaje por proyectos

Es evidente que el aprendizaje por proyectos ofrece numerosas ventajas pero, también, es evidente que requiere de un cambio metodológico y de un gran esfuerzo por parte de los docentes.

Las TIC pueden ayudar a mejorar el trabajo de los alumnos y de los profesores a la hora de afrontar esta metodología, pues facilitarían mucho su implementación. Sin embargo, no es esta la única causa para su utilización, deben ser integradas en el aula por cómo impregnan nuestro mundo en la actualidad. Así, si no podemos contemplar los aprendizajes escolares sin tener en cuenta las TIC, menos aun cuando empleemos el aprendizaje basado en proyectos, pues este tipo de aprendizaje se debe centrar en problemas cotidianos, reales, donde las TIC lo envuelven, prácticamente, todo.



~~El uso de las TIC en el aprendizaje por proyectos~~ **Aplicaciones para la gestión de proyectos**

Las aplicaciones para la gestión de proyectos nos permiten organizar y gestionar los recursos, las personas, las tareas, los tiempos, etc. de un proyecto, de manera que nos facilite la consecución en tiempo de nuestro trabajo con una utilización óptima de los recursos.

Cuando aplicamos la metodología de aprendizaje por proyectos este tipo de software nos va a permitir, entre otras cosas:

- Visualizar y poner en claro cada una de las fases del proceso de investigación o de la resolución del problema.
- Administrar de forma óptima el proyecto.
- Adecuar la situación de aprendizaje a un contexto de trabajo real.

Sin embargo, como ocurre habitualmente, la mera utilización de una herramienta, no supone, en absoluto, que vaya a aportar elementos positivos a nuestro trabajo. Tenemos que ser conscientes de la necesaria adecuación del software que vamos a emplear a nuestras necesidades y conocimientos. Es pues una labor del profesor, colaborar con los alumnos en la selección del software más adecuado en función de las necesidades que debemos cubrir.

A continuación enumeramos algunas de estas herramientas. Hemos tenido en cuenta que se trate de software libre o gratuito, siendo conscientes de que no se trata de un listado exhaustivo y de que podemos estar dejando distribuciones fuera de este listado.

APLICACIÓN

VERSIÓN

WEB

ARQUITECTURA

LICENCIA

FUNCIONALIDADES



MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC

Escrito por Cesar Vallejo
Mércores, 15 Agosto 2012 00:00

1.4.5

27/09/10

- [Web](#)
- [Demo](#)

Apache, PHP, MySQL

GPL

- Registro de tiempo
- Administración de proyectos (proyectos, fases, tareas, notas, estadísticas, planning, miembros)
- Gestión de contactos
- Gestión de personal
- Agenda
- Informes
- Flexible y configurable



4.0.3.1.0

29/03/12

- [Web](#)
- [Demo](#)

MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC

Escrito por Cesar Vallejo

Mércores, 15 Agosto 2012 00:00

AOL Server, Open ACS, TCL

CPOL

- Registro de tiempo
- Gestión de errores/problemas
- Diagrama de Gantt
- Informes
- Control de tiempo en función de variables
- Control horario
- WorkFlow
- Gestión de ficheros
- Administración de recursos
- Plantillas
- Calendario
- Contactos



1.8.2011

23/12/11

- [Web](#)
- [Demo](#)

MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC

Escrito por Cesar Vallejo
Miércoles, 15 Agosto 2012 00:00

PHP, MySQL, Apache

GPL

- | | |
|---|---|
| - | Calendario |
| - | Grupos |
| - | Agenda |
| - | Gestión de errores |
| - | Gestión de proyectos (tareas, documentos, diversos roles, relación entre proyectos) |
| - | Buzones de correo |
| - | Gestión de tiempo |
| - | Inventario |



0.8.8 01/09/12

- [Web](#)



PHP, MySQL, Apache

AGPL

- | | |
|---|-----------------------|
| - | Gestión de usuarios |
| - | Gestión de clientes |
| - | Gestión de proyectos: |

MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC

Escrito por Cesar Vallejo

Mércores, 15 Agosto 2012 00:00

- | |
|---|
| Notas |
| Tareas |
| Ficheros |
| Calendario no editable (solo para tareas) |
| Gestión de contactos |



6.1.0

15/05/12

- [Web](#)
- [Demo](#)

PHP, MySQL, Apache, WebDAV

LGPLv3

- | |
|---|
| Administración de ficheros |
| Diagrama de Gantt |
| Seguimiento de errores o problemas |
| Actas de reuniones (personal, correo, archivos, etc.) |
| Notas |
| Estadística |
| Gestión de tareas pendientes |
| Calendario |
| Contactos |
| Tarjeta de tiempo |



2.2.0 04/05/12

- [Web](#)



PHP, MySQL, Apache

BSD

- Gestión de proyectos:
 - Tareas (Posibilidad de comentarios)
 - Ficheros
-
- Calendario
 - Gestión de contactos



2.0.0 21/03/12

MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC

Escrito por Cesar Vallejo

Mércoles, 15 Agosto 2012 00:00

- [Web](#)
- [Demo](#)

PHP, MySQL, Apache

AGPLv3

- Gestión de usuarios
- Gestión de correo
- Gestión de espacios de trabajo:
- Notas
- Tareas
- Documentos



1.2.3

01/06/12

- [Web](#)
- [Demo](#)

MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC

Escrito por Cesar Vallejo
Miércoles, 15 Agosto 2012 00:00

Java, Tomcat y PostgreSQL, LDAP

AGPL

- Gestión de recursos (empleados, máquinas)
- Calendarios
- Habilidades del recurso
- Actividades y tiempo
- Diagrama de Gantt
- Asignación de recursos
- Simulaciones
- Plantillas
- Asignación avanzada de tareas
- Vistas y seguimiento



2.0.2

06/05/12

- [Web](#)
- [Demo](#)

Ruby, MySQL, Apache

MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC

Escrito por Cesar Vallejo
Miércoles, 15 Agosto 2012 00:00

GNUv2

- Múltiples proyectos
- Roles flexibles
- Seguimiento de tareas
- Diagrama de Gantt
- Calendario
- Gestión de noticias, documentos y archivos
- Feeds
- Wiki
- Foro
- Seguimiento de tiempo
- Campos personalizados
- Múltiple LDAP autenticación



1.8.004



- [Web](#)
- [Demo](#)

Apache, PHP, MySQL

GPL

- Calendario

MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC

Escrito por Cesar Vallejo

Mércores, 15 Agosto 2012 00:00

- Libreta de direcciones
- Gestión de tareas
- Administración de archivos
- Sistema de seguimiento
- Administrador de proyectos
- Administrador de sitios
- Gestión de recursos
- Wiki
- Base de conocimientos



0.14.4

- [Web](#)

Escritorio

GPLv2


- Gestión de calendarios
- Gestión de recursos
- Seguimiento del avance del proyecto
- Enlazar tareas
- Diagramas de Gantt
- Exportación a diferentes formatos



Escrito por Cesar Vallejo


Diagrama de Gantt

Un diagrama de Gantt es la representación gráfica del tiempo que dedicamos a cada una de las tareas en un proyecto concreto, siendo especialmente útil para mostrar la relación que existe entre el tiempo dedicado a una tarea y la carga de trabajo que supone. Una de sus limitaciones es que no muestra la relación de dependencia que pueda existir entre grupos de tareas. Los diagramas de Gantt fueron ideados por Henry L. Gantt en 1917 (un año antes de la creación del método de aprendizaje por proyectos) con la intención de ofrecer un método óptimo para visualizar la situación de un proyecto.

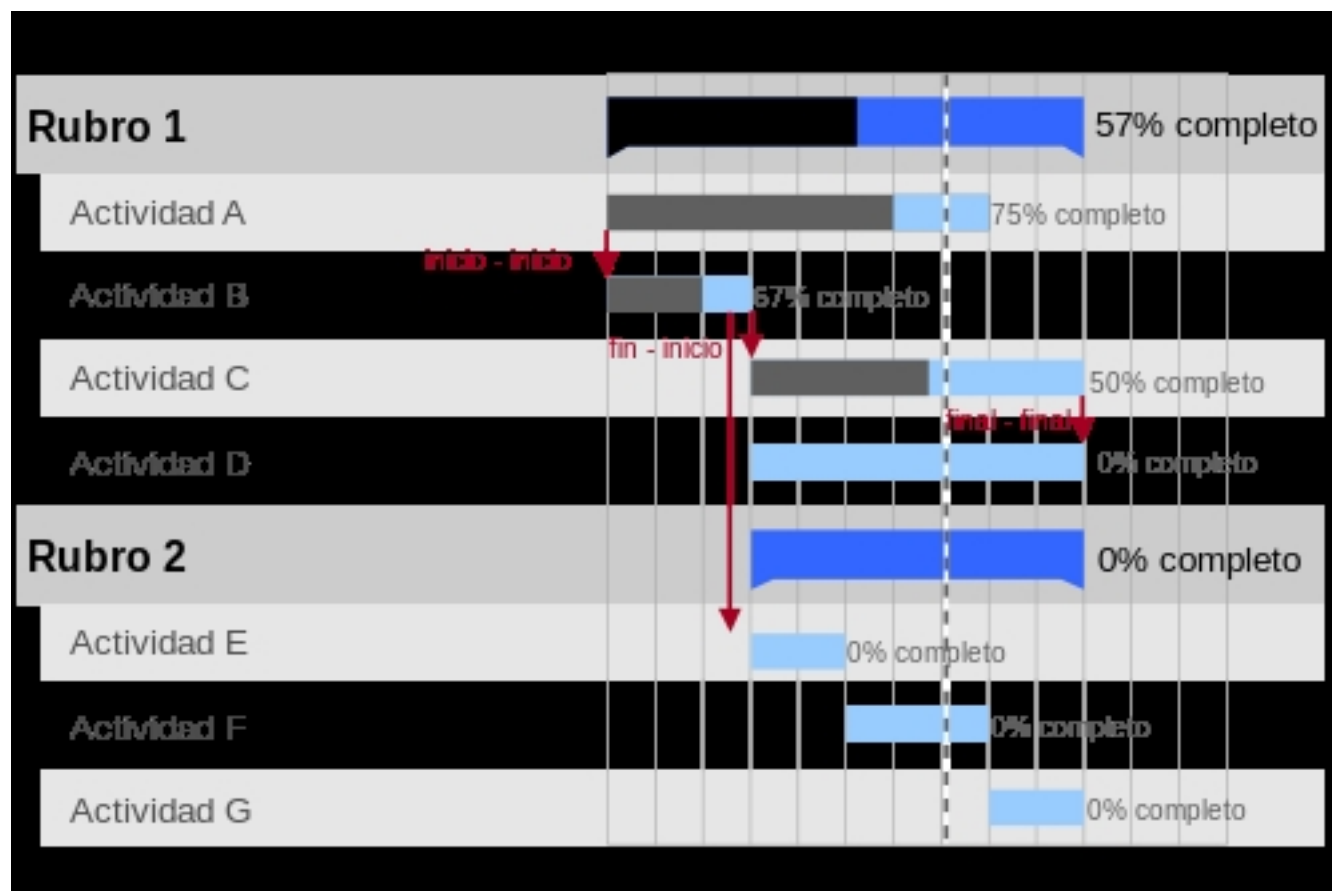


Si consideramos que para el desarrollo de un proyecto debemos efectuar una serie de tareas simultáneas o consecutivas, que podríamos denominar unidades mínimas de trabajo, el diagrama de Gantt nos permite mostrar este desarrollo en el tiempo de las tareas de forma gráfica. Es pues, básicamente, un gráfico en el que se muestra la duración de un conjunto de actividades.

Cada tarea es representada por una línea en cada una de las filas del diagrama, mientras que las columnas representan el tiempo en distintas escalas (días, semanas, o meses del programa) dependiendo de la duración del proyecto. En cada una de las tareas la fecha de inicio y la fecha de finalización del proyecto corresponden al inicio y final (respectivamente) de la barra correspondiente a dicha actividad. Las tareas deben ser ordenadas de arriba hacia abajo en función de la fecha de comienzo de las mismas.

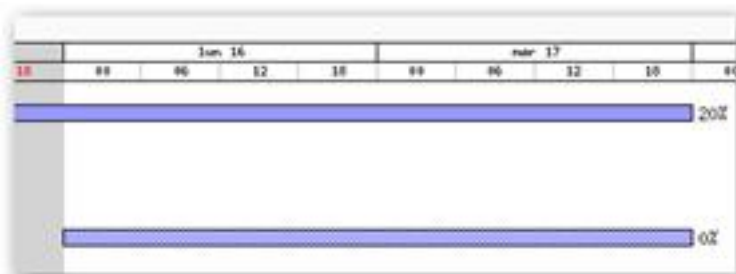

Las tareas se pueden colocar en cadenas secuenciales o se pueden realizar simultáneamente.

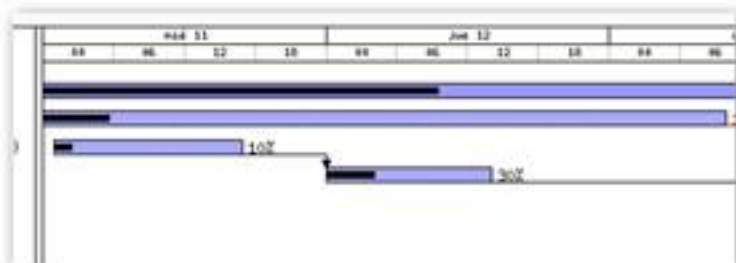

Si las tareas son secuenciales, la temporalización se puede confeccionar utilizando las horas de inicio y finalización de tareas, de manera que una tarea que precede a otra, o que es una sub tarea de ésta, debe comenzar siempre después de la anterior.

Esta relación entre tareas se puede definir a través de las relaciones de precedencia y restricciones. Aunque existen distintos tipos de relaciones, las tareas de eGroupware sólo admiten de tres tipos:

- **Comenzar después de** otra tarea significa que hasta que no haya finalizado la tarea anterior, no podremos comenzar la que estamos planificando
- **Finalizar antes de** significa que deberemos finalizar la tarea que estamos planificando antes de comenzar la siguiente
- **Hitos** que marcan el final de una tarea o conjunto de tareas.

The screenshot displays a task management interface. At the top, a Gantt chart shows a task bar with a 10% completion mark and a 30% completion mark. A red box highlights the 10% mark, and a red arrow points from it to the 'Finalizar antes' (Finish before) section of the task details panel below. The task details panel has tabs for 'Fechas', 'Tiempos', 'Restricciones', 'Recursos', and 'Detalles'. The 'Restricciones' tab is selected. It shows three sections: 'Comenzar después de' (Start after), 'Finalizar antes' (Finish before), and 'Hitos' (Milestones). The 'Finalizar antes' section has a red box around the entry 'Registro de notas y tareas: Realización de documento (#8)', which is checked. The 'Hitos' section shows two milestones: '13.07.2012: Presentación documentos con manuales' and '17.07.2012: Entrega de documentación'. At the bottom, a status bar indicates the task was modified on 11.07.2012 at 12:50 by Vallejo, César, and the current time is 11.07.2012 12:35.

Fechas	Tiempos	Restricciones	Recursos	Detalles
Comenzar después de				
☐ Registro de notas y tareas: Fase I. Información (#6)				
☐ Registro de notas y tareas: Fase II. Formación (#9)				
☐ Registro de notas y tareas: Realización de documento (#8)				
Finalizar antes				
☒ Registro de notas y tareas: Realización de documento (#8)				
☐ Registro de notas y tareas: Fase I. Información (#6)				
☐ Registro de notas y tareas: Fase II. Formación (#9)				
Hitos				
☐ 13.07.2012: Presentación documentos con manuales				
☐ 17.07.2012: Entrega de documentación				

Modificado 11.07.2012 12:50 por Vallejo, César 11.07.2012 12:35

A medida que progresa una tarea, se completa proporcionalmente la barra que la representa hasta llegar al grado de finalización. Así, es posible obtener una visión general del progreso del

proyecto rastreando una línea vertical a través de las tareas en el nivel de la fecha actual.



El nivel de progreso de una tarea se introduce manualmente.

Fecha de finalización	13.07.2012	
Completado	30%	
Privado	0%	
	10%	
	20%	
Última modificación	30%	11.07.2012
	40%	12:16

No conviene crear diagramas de Gantt que incluyan más de 20 tareas, en ese caso deberíamos ayudarnos de diagramas de PERT.

Creación de un diagrama de Gantt

Una vez que tenemos claro cuál es el objeto de nuestro proyecto y con qué tareas se va a cubrir podremos proceder a realizar el diagrama de Gantt. Aunque para hacerlo podemos emplear una hoja de cálculo como LibreOffice Calc, existen aplicaciones libres y gratuitas que nos permiten efectuar este trabajo (Planner, Gantt Project, Redmine,...).

1. Dibujamos la planilla para nuestro diagrama:
1. Primera columna las actividades.
2. Primera fila la escala de tiempo.

3. Escribimos los nombres de las tareas, que no dependen de ninguna precedente, en la columna 1ª y dibujamos los bloques de tiempo en cada una de sus filas, coincidiendo el inicio del bloque con la fecha de inicio de la actividad y la finalización con la fecha prevista para su consecución.

4. Añadimos los hitos del proyecto.

5. Añadimos las actividades que dependen de las anteriores siguiendo el mismo criterio expuesto anteriormente teniendo en cuenta las dependencias existentes:

1. Fin-inicio
2. Inicio-inicio.
3. Final-final.
4. Retardos.

5. Repetimos con nuevas actividades dependientes de las anteriores.

ProjectManager

ProjectManager es un módulo de **eGroupware** orientado a la creación y administración de proyectos. Sus funcionalidades básicas son:

- **Planificar y gestionar el personal y presupuestos.**
- **Establecer hitos.** Puntos de referencia que simboliza la consecución de un logro en un proyecto, una fecha de entrega importante, un vencimiento, etc. Se considera, también, como una tarea de duración cero. Se emplea para establecer los momentos en los que se da por supuesto que se ha conseguido un objetivo o se ha finalizado una fase de un proyecto. Los hitos nos permiten comparar la dinámica seguida en la realidad con las fases programadas de nuestro proyecto.
- **Crear y editar tareas.** Las tareas son piezas de trabajo que debe efectuarse para completar un proyecto. La tarea debe tener perfectamente definido su principio y su fin. Es conveniente que duren, al menos, un día y se incorporen en el proyecto en el mismo orden en el que deben de ser ejecutadas. Según establezcamos un nivel de concreción mayor en las tareas, lograremos una mayor definición del proyecto, sin embargo es necesario ponderar el esfuerzo que esto requiere.
- **Visualización del estado del proyecto en un diagrama de Gantt.** Se entiende por diagrama de Gantt una herramienta gráfica que permite representar el tiempo de dedicación previsto para la realización de distintas tareas.
- **Utilizar un sistema de derechos de usuario basado en roles.** Un usuario puede ser asignado a un proyecto y dentro del mismo puede desempeñar un rol determinado.

- **Crear plantillas de proyectos.** Estas plantillas pueden ser reutilizadas en otros proyectos incluyendo procedimientos que se repiten.

Interfaz

Para trabajar con ProjectManager disponemos de varias vistas:

- **Lista de proyectos.** Nos muestra un listado de todos los proyectos creados con ProjectManager. Accedemos a esta vista a través del Panel de administración de proyectos (una vez que hemos accedido a ProjectManager). En esta vista podemos trabajar con las opciones generales de cada proyecto: acceder a la vista del diagrama de Gantt, ver los aspectos generales del proyecto, editar los parámetros con los que se ha creado el proyecto o borrarlo.
- El proceso que deberíamos seguir, una vez que nos registramos en el sitio, sería:
 1. Hacemos clic en Administrador de proyectos
 2. Hacemos clic en Lista de proyectos del panel De administración de proyectos.



- 1.
4. Accedemos al listado de proyectos.

MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC


Escrito por Cesar Vallejo
Miércoles, 15 Agosto 2012 00:00



ID del proyecto	Título	Prioridad	Propietario	Fecha de inicio Planificado	Fecha de finalización Planificado	Progreso Planificado	Tiempo Planificado	Estado	Última modificación	Acciones
P-2012-0000	Proyecto base	1	Vallejo, Cesar	12.07.2012 11.07.2012	24.07.2012 24.07.2012		4.8 d		12.07.2012 11:01 Vallejo, Cesar	
P-2012-0004	Proyecto 2012 presentación	10	Hernández, Adrián	12.07.2012 12.07.2012	17.07.2012 11.07.2012				12.07.2012 09:57 Hernández, Adrián	

- **Lista de elementos de un proyecto.** Esta vista nos permite visualizar todos los elementos que se incluyen en un proyecto: hitos, tareas, etc. Accedemos a esta vista haciendo clic en el nombre del proyecto en la **Lista de proyectos**

. En esta vista podemos acceder al diagrama de Gantt del proyecto y ver  o editar  sus parámetros de configuración. Además, podemos ver , editar , o borrar  cualquiera de los elementos que componen este proyecto.

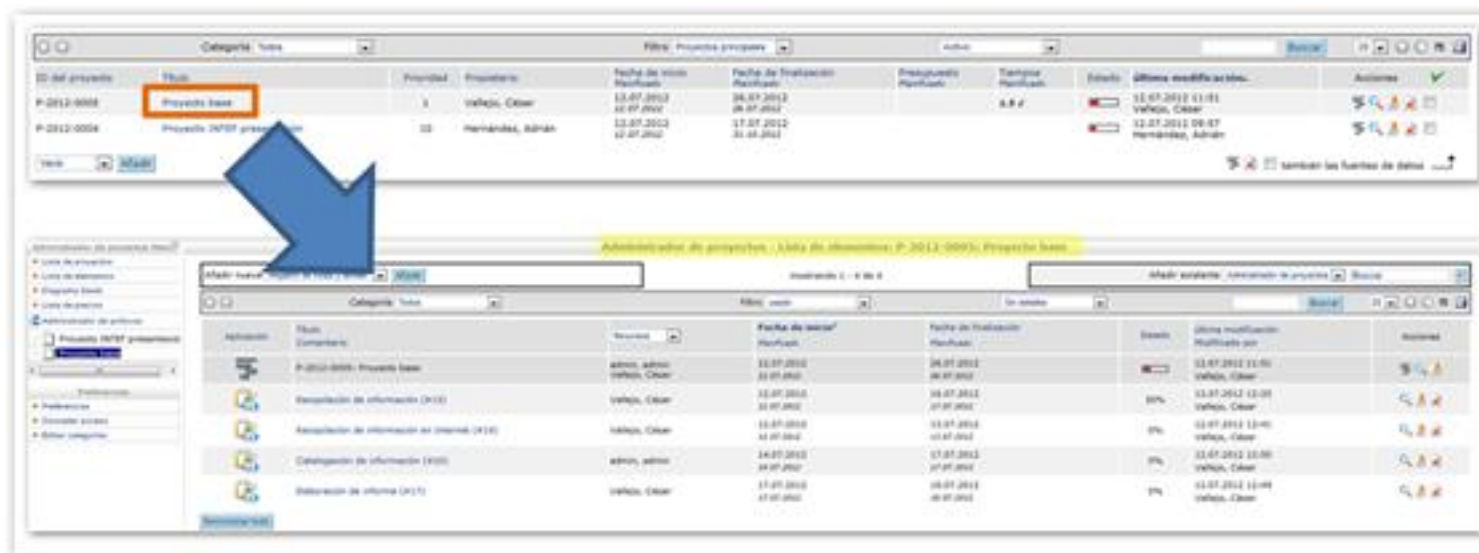

ID	Título	Propietario	Fecha de inicio Planificado	Fecha de finalización Planificado	Progreso	Última modificación
P-2012-0000	Proyecto base	Vallejo, Cesar	12.07.2012 11.07.2012	24.07.2012 24.07.2012		12.07.2012 11:01 Vallejo, Cesar
P-2012-0004	Proyecto 2012 presentación	Hernández, Adrián	12.07.2012 12.07.2012	17.07.2012 11.07.2012		12.07.2012 09:57 Hernández, Adrián

ID	Título	Propietario	Fecha de inicio Planificado	Fecha de finalización Planificado	Progreso	Última modificación
P-2012-0000	Proyecto base	Vallejo, Cesar	12.07.2012 11.07.2012	24.07.2012 24.07.2012		12.07.2012 11:01 Vallejo, Cesar
P-2012-0001	Recopilación de información (H1)	Vallejo, Cesar	12.07.2012 11.07.2012	17.07.2012 11.07.2012	0%	12.07.2012 12:01 Vallejo, Cesar
P-2012-0002	Recopilación de información en Internet (H2)	Vallejo, Cesar	12.07.2012 11.07.2012	17.07.2012 11.07.2012	0%	12.07.2012 12:01 Vallejo, Cesar
P-2012-0003	Organización de información (H3)	Vallejo, Cesar	12.07.2012 11.07.2012	17.07.2012 11.07.2012	0%	12.07.2012 12:01 Vallejo, Cesar
P-2012-0004	Selección de información (H4)	Vallejo, Cesar	12.07.2012 11.07.2012	17.07.2012 11.07.2012	0%	12.07.2012 12:01 Vallejo, Cesar

- **Vista de Diagrama de Gantt.** Esta vista nos muestra el proyecto en formato de diagrama de Gantt y nos permite ver o editar cualquiera de los elementos que integran el proyecto.

MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC

Escrito por Cesar Vallejo


Mércores, 15 Agosto 2012 00:00



Opinión de los autores: Este es un documento de trabajo y no debe ser utilizado como fuente de información para la creación de un proyecto con ProjectManager

Paso 1. Creación de un proyecto

Entendemos como proyecto un conjunto de actividades y tareas que deben desarrollar un equipo para alcanzar unas metas propuestas. Un proyecto es, entonces, una secuencia de acciones orientadas a la consecución de un fin.

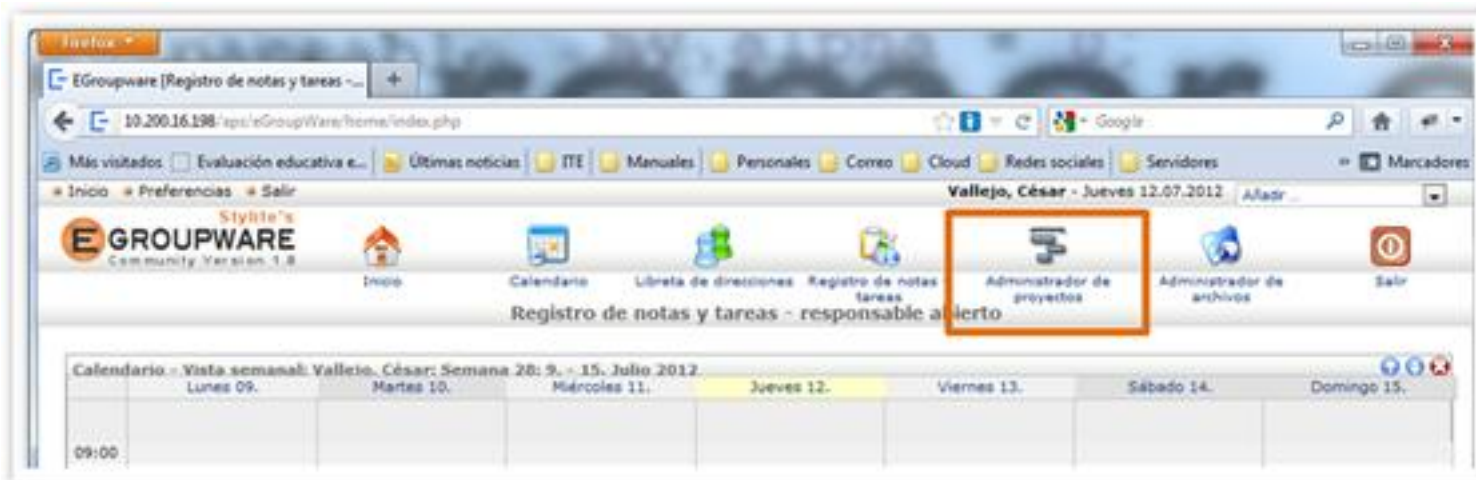

Para crear un proyecto deberemos:

1. Una vez autenticados en el portal, deberemos hacer clic en el icono de **Administración de proyectos**



3. Accedemos al administrador de proyectos y observamos una tabla con todos los proyectos existentes. Podemos añadir un proyecto haciendo clic en el botón **Añadir** situado en la zona inferior izquierda de la tabla. El combo que aparece junto a este botón permite seleccionar entre añadir un proyecto vacío o crear uno desde una plantilla.



4. Observamos que se nos muestra una ventana con un conjunto de campos que podemos cumplimentar para crear nuestro proyecto. De todos ellos, sólo el campo **Título** es obligatorio.

1. Hacemos clic en el botón **Aplicar** guardar el proyecto y seguir introduciendo nuevos datos o

2. **Grabar** para guardar y cerrar el proyecto.

MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC

Escrito por Cesar Vallejo

Mércores, 15 Agosto 2012 00:00

The image displays four sequential screenshots of a web-based project management application. The interface is organized into tabs: General, Descripción, Miembros, Cuentas, personalizado, and Enlaces. The first screenshot shows the 'General' tab where a new project is being created, with fields for ID, Title, Category, Priority, and various dates. The second screenshot shows the 'Miembros' tab, where a list of members is displayed, including their names and roles. The third screenshot shows the 'Enlaces' tab, where a list of links is displayed. The fourth screenshot shows the 'Historial' tab, where a list of history entries is displayed. The interface is in Spanish and includes various buttons for actions like 'Crear', 'Actualizar', and 'Cancelar'.

Acceder y editar un proyecto

En ocasiones, una vez definido el proyecto, puedes encontrarte con la necesidad de modificar alguno de los parámetros iniciales, incluso, añadir otros que te permitan definir mejor dicho

MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC

Escrito por Cesar Vallejo
Miércoles, 15 Agosto 2012 00:00

proyecto. Es distinto editar un proyecto para modificar sus parámetros que añadir tareas, hitos, etc.

Puedes acceder a cualquier proyecto a través del enlace **Lista de proyectos** que aparece en el panel superior izquierdo del interfaz de eGroupware.



Cuando grabas un proyecto, también accedes a esta vista.

The image shows the 'Lista de proyectos' view in eGroupware. It displays a table with project information. The table has columns for ID, Title, Priority, Owner, Start Date, End Date, Budget, and Status. Two projects are listed: 'Proyecto base' and 'Proyecto INTOP presentación'. The 'Acciones' column on the right contains icons for editing and deleting projects. The 'Proyecto base' row is highlighted with an orange rectangle.

ID del proyecto	Título	Prioridad	Propietario	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Presupuesto	Estado	Última modificación	Acciones
P-2012-0005	Proyecto base	1	vallejo, Cesar	12-07-2012	26-07-2012			12-07-2012 10:45 vallejo, Cesar	
P-2012-0004	Proyecto INTOP presentación	10	hernandez, Adrian	12-07-2012	04-07-2012			12-07-2012 09:57 hernandez, adrian	

Comprobarás que tienes una tabla, en la que se muestran todos los proyectos a los que tienes acceso, con información de sus parámetros básicos y un conjunto de iconos en la columna **Acciones**

que se encuentra a la derecha de la tabla. Estos iconos nos permitirán:

- Acceder al diagrama de Gantt 

(vista diagrama de Gantt del proyecto)

- Enseñar los elementos del proyecto (fechas, miembros, etc.) 
- . Desde aquí también podremos editar los parámetros del proyecto haciendo clic en el botón Editar que se nos mostrará en el interfaz.
- Editar los parámetros del proyecto (fechas, miembros, etc.) 
- .
- Eliminar el proyecto 
- .

Paso 2. Creación de hitos

Una vez que has definido el proyecto, conviene señalar sus momentos clave.

Los hitos son estos momentos clave en el desarrollo de un proyecto. Pueden ser evaluaciones, presentaciones, etc. También se consideran tareas de duración 0.

Cuando creamos un proyecto resulta de especial interés marcar los hitos, de manera que establezcamos una serie de momentos críticos o especialmente significativos que debemos tener en cuenta cuando vayamos a programar las tareas que configurarán dicho proyecto.

Los pasos que debes seguir para crear un hito son:

1. Cuando accedes a un proyecto concreto haciendo clic sobre él en la ventana de **Lista de proyectos**, comprobarás que aparecen los datos generales del proyecto que has creado. Es la lista de elementos del proyecto.




Aplicación	Título Comentario	Sección	Fecha de inicio Planificado	Fecha de finalización Planificado	Estado	Última modificación: Modificado por	Acciones
	P-2012-0005: Proyecto base	admin, admin Vallejo, Cesar	11.07.2012 01.07.2012	26.07.2012 26.07.2012		11.07.2012 10:41 Vallejo, Cesar	

3. En la columna **Acciones**, que se encuentra al final de la tabla, verás que aparecen

Escrito por Cesar Vallejo
Miércoles, 15 Agosto 2012 00:00

tres iconos que te ofrecen las mismas opciones que en la vista anterior. Accede al icono **Diagrama de Gantt**

4. Observarás que se muestra un diagrama de Gantt con una barra que abarca la duración del proyecto. Si hubiera tareas u otros elementos asociados al proyecto también se mostraría. Desde esta vista, haciendo clic sobre la barra del proyecto o sobre su nombre verás que accedes a los datos del mismo con posibilidades de editarlo.

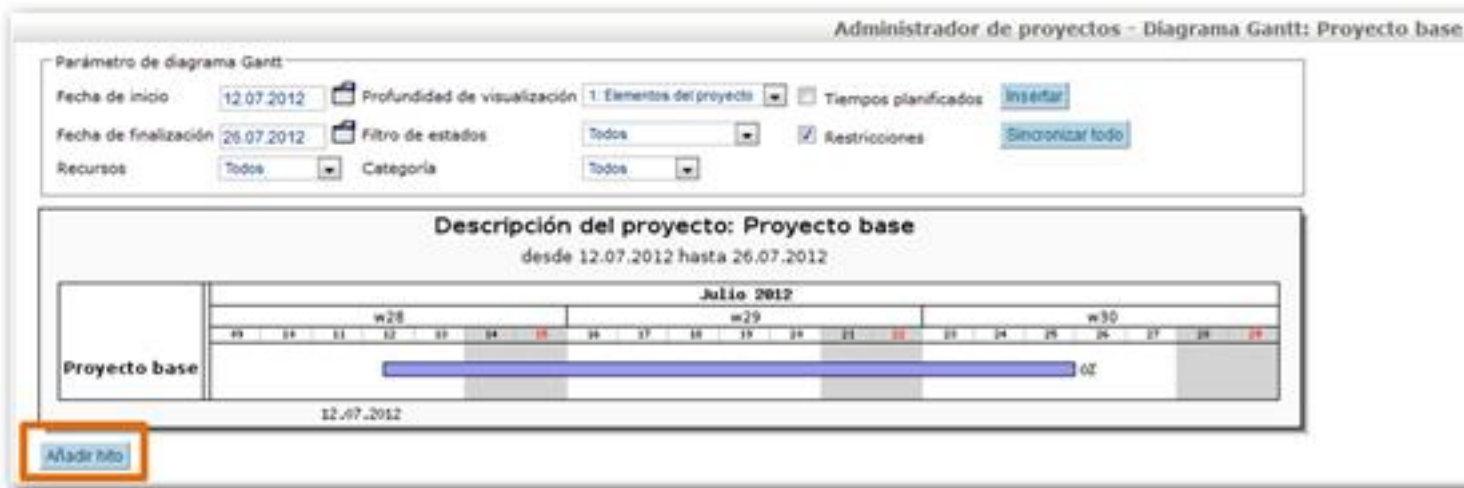

5. Haz clic en el botón **Añadir Hito**, para crear un hito en este proyecto.

1. Vemos que aparece asociado a nuestro proyecto, aunque también podríamos seleccionar otro.

2. Le asignamos un nombre, la fecha y una descripción.

3. Hacemos clic en el botón **Grabar**.

Administrador de proyectos - Añadir hito - Mozilla Firefox

Proyecto: Proyecto base

Título: Entrega del proyecto

Fecha: 26.07.2012

Descripción:

Grabar Cancelar Cerrar

4. Comprobamos que el hito se ha creado en el diagrama de Gantt.



Los hitos, además, nos permiten restringir la duración de las tareas.

Paso 3. Añadir tareas

Para terminar de definir el proyecto deberemos agregar un conjunto de tareas y subtareas. A través del administrador de proyectos o de la Lista de proyectos accedemos al proyecto en el que queremos incluir las tareas.




Mediante el combo superior izquierdo podemos añadir un nuevo elemento a nuestro proyecto. Con el combo superior derecho, agregaríamos otro ya existente.

Seleccionamos Añadir nueva **Registro de notas** y tareas y hacemos clic en el botón **Añadir**.

MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC

Escrito por Cesar Vallejo
Miércoles, 15 Agosto 2012 00:00



Disponemos de cuatro tipos distintos de tareas:

- Correo electrónico 
- Llamada telefónica 
- Nota 
- Tareas pendientes 



Nos vamos a centrar en este último elemento por ser clave en el desarrollo de proyectos, aunque todos ellos quedarían reflejados en nuestro proyecto, en caso de incluirlos.

Cumplimentamos los siguientes campos:

1. **Asunto:** donde indicaremos brevemente el tema de la tarea.
2. **Fechas de inicio y finalización:** además de estas fechas podremos incluir el estado y el porcentaje de desarrollo en el que se encuentra la tarea. También se puede determinar si es pública o privada.
3. **Pestañas.**
 1. Pestaña **Descripción:** explicamos en detalle la tarea concreta.
 2. Pestaña **Enlaces:** nos muestra que esta tarea está incluida en el proyecto y, además, nos permite adjuntar archivos o asociar la tarea a otros elementos del proyecto.
 3. Pestaña **Delegación.** Nos permite asignar a un miembro del proyecto la realización de la tarea.
 4. Pestaña **Administración** de proyectos donde le podemos asignar un coste en horas o económico a la tarea
5. Hacemos clic en el botón **Guardar.**
6. La tarea se nos muestra en la Vista elementos del proyecto.



The screenshot shows a web application interface for project management. At the top, there are search bars and filters. Below, a table lists tasks with columns for Application, Title, Resource, Start Date, End Date, Status, Last Modified, and Actions. Two tasks are visible: 'P-2012-0000: Proyecto base' and 'Recopilación de información (FIS)'. The second task is highlighted with an orange box, and its 'Actions' column contains icons for viewing, editing, and deleting the task.

Aplicación	Título	Recursos	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado	Última modificación	Acciones
	P-2012-0000: Proyecto base	admin, admin-vallejo, Cesar	12.07.2012	21.08.2012		12.07.2012 11:03	
	Recopilación de información (FIS)	Vallejo, Cesar	12.07.2012	13.07.2012	0%	12.07.2012 11:44	  

Desde esta ventana podremos:

- Visualizar la tarea 
- Editar la tarea y cambiar alguno de sus elementos 
- Eliminar la tarea 

Si, a continuación accedemos al diagrama del Gantt del proyecto haciendo clic en el icono  de la columna de acciones comprobaremos cómo se ha cargado.



Paso 4. Restringir tareas

Partimos de la idea de que en un proyecto no existe ninguna tarea aislada, sino que unas tareas dependen de otras, se encuentran entrelazadas. Cuando elaboramos un proyecto, debemos reflejar estos vínculos.

Restringir una tarea supone forzar a que comience o finalice en función de la realización de otras tareas o de la consecución de un hito.

Cuando hemos añadido una tarea a un proyecto observamos que, al editarla, ha aparecido una nueva pestaña denominada


Restricciones

1. Accedemos a la lista de proyectos.
 2. Seleccionamos el proyecto en el que deseamos restringir la tarea.
 3. Hacemos clic en el botón Editar 
- de la tarea.
4. Accedemos a la pestaña **Restricciones**.
 5. Marcamos la opción deseada.

MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC

Escrito por Cesar Vallejo

Mércores, 15 Agosto 2012 00:00

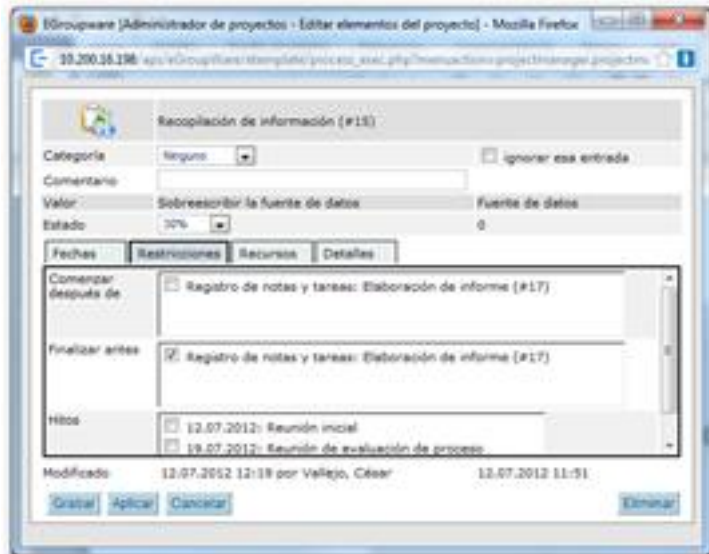

Observa que aparece una flecha gris que relaciona las dos tareas en el diagrama de Gantt.



Si en la restricción hubieras cometido un error de planificación, la flecha aparecería de color



Paso 5. Crear sub tareas

Cuando una tarea es compleja se puede dividir en sub tareas. Para crear una sub tarea desde ProjectManager deberemos:

1. Accedemos a la lista de proyectos.
2. Seleccionamos el proyecto en el que deseamos restringir la tarea.
3. Seleccionamos **Añadir nueva Registro de notas y tareas**.
4. Cumplimentamos los datos tal y como hemos hecho anteriormente, pero en la opción Superior, hacemos clic en el botón > que aparece a su lado para acceder a todas las tareas ya creadas



5. Seleccionamos la tarea de la cual deseamos hacerla depender.



6. Aplicamos y/o guardamos tal como hemos hecho siempre.

Accediendo a la tarea principal (haciendo clic en el nombre) desde la vista de elementos del proyecto comprobaremos que dispone de la nueva sub tarea.



Sub proyectos

Otra opción que nos ofrece ProjectManager para poder trabajar con tareas más complejas es crear un sub proyecto, con sus tareas, dentro de otro proyecto. Un sub proyecto se crea a través de los siguientes pasos:

1. A través del administrador de proyectos o de la Lista de proyectos accedemos al proyecto en el que queremos incluir las tareas.
2. Mediante el combo superior izquierdo podemos añadir un nuevo elemento a nuestro proyecto. Con el combo superior derecho, agregaríamos otro ya existente.



3. Seleccionamos Administrador de proyectos y hacemos clic en Añadir.

MONOGRÁFICO: Aprendizaje por proyectos y TIC

Escrito por Cesar Vallejo
Miércoles, 15 Agosto 2012 00:00



En el menú de herramientas de la barra de herramientas, hacemos clic en el botón Guardar. Ya

Aplicación	Título Comentario	Recursos	Fecha de inicio Planificado	Fecha de finalización Planificado
	P-2012-0005: Proyecto base	admin, admin Vallejo, César	12.07.2012 12.07.2012	26.07.2012 26.07.2012
	P-2012-0005/0001: Otro proyecto	admin, admin Vallejo, César	16.07.2012 16.07.2012	20.07.2012 20.07.2012
	13.07.2012 - 10:00: Reunión inicial	Vallejo, César	13.07.2012	13.07.2012

En el menú de herramientas de la barra de herramientas, hacemos clic en el botón Guardar. Ya

Además de las tareas, elementos que hemos empleado para desarrollar un proyecto. ProjectManager admite otros elementos:

- **Calendario.** Que permite añadir citas, reuniones, etc. A un proyecto.
- **Libreta de direcciones.** Que facilita la inclusión de un contacto dentro de la libreta de direcciones de eGroupware.

Notas

Esta pestaña no aparece si no se han creado campos personalizados.

Las opciones de edición de una tarea son distintas en función del lugar desde que estemos accediendo al modo de edición.

Podemos editar una tarea haciendo clic sobre ella en el diagrama de Gantt y luego en el botón

Editar, o accediendo a ella a través del botón de edición de la vista de elementos del proyecto.

Si no existen hitos u otras tareas no podremos restringirla.

Conclusión

La inclusión de las TIC en el aula es algo que ya no se discute debido a la gran cantidad de ventajas y a la forma en la que enriquecen los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En este contexto, la metodología de aprendizaje por proyectos unida al uso de las TIC puede ofrecer experiencias de aprendizaje de gran calidad basadas en el constructivismo y el aprendizaje significativo.
